

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Липецкий филиал Финансового университета

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе»

**Методические рекомендации к выполнению
курсового проекта по дисциплине
«Практикум по ИТ-менеджменту»**

Рекомендуется для направления подготовки:
38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»
Очная и заочная формы обучения
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

*Методическое обеспечение рассмотрено
и одобрено на заседании Департамента бизнес-информатики
(протокол № 2 от 16.09.2025)
Заведующий кафедрой: Морозова Н.С.*

Липецк 2025

Методические рекомендации к выполнению курсового проекта составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Практикум по ИТ-менеджменту» для студентов, обучающихся по профилю «ИТ-менеджмент в бизнесе» направления подготовки бакалавров 38.03.05 Бизнес-информатика.

Разработчик:

Черпаков И.В., к.ф.-м.н., ст. преп. кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета.

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	6
2.1. Выбор и утверждение темы курсового проекта	6
2.2. Согласование плана курсового проекта с руководителем	7
2.3. Выполнение курсового проекта	8
2.4. Представление курсового проекта руководителю	8
2.5. Защита курсового проекта	9
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	11
3.1. Требования к структуре и содержанию проекта	11
3.2. Раздел «Обоснование проекта»	12
3.3. Раздел «Анализ окружения»	13
3.4. Раздел «Основные положения устава проекта»	13
3.5. Раздел «Содержание проекта»	14
3.6. Раздел «Организационная структура проекта»	15
3.7. Раздел «Смета проекта»	15
3.8. Раздел «Календарный план проекта»	15
3.9. Раздел «План управления рисками»	16
3.10. Раздел «План управления изменениями»	16
3.11. Раздел «Мониторинг выполнения проекта и управленческая отчетность»	16
3.12. Требования к оформлению	18
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ	19
5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 11	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 12	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 13	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания устанавливают порядок подготовки и защиты курсового проекта по дисциплине «Практикум по ИТ-менеджменту» на кафедре «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата).

Методические указания составлены в соответствии Приказами ректора от 02.07.2021 г. № 1583/о «Об утверждении Положения о курсовом проектировании по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата в Финансовом университете» и от 12.11.2015 №2372/о «Об утверждении Регламента размещения на информационно-образовательном портале Финуниверситета курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, порядок хранения и списания», а также учебными планами подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения.

Выполнение курсового проекта является одним из видов учебных занятий, предусмотренным учебным планом.

Выполнение курсового проекта проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к проектной и научно-исследовательской деятельности, позволяющих проводить:

- разработку проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- разработку проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, управлении и ИКТ;

Целями курсового проекта также являются:

- закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе изучения дисциплины

«Управление ИТ-проектами», «Информационные системы управления производственной компанией», «Инжиниринг бизнеса».

- приобретение навыков самостоятельных научных исследований;
- приобретение навыков оформления научных исследований;
- приобретение опыта публичных выступлений.

Основным инструментальным средством для построения математической модели проекта является MS Project, а также MS Word, MS Excel, MS Visio, BizAgi Process Modeler.

Материалы курсового проекта могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В процессе выполнения курсового проекта выделяют следующие этапы:

- выбор темы курсового проекта студентами и предоставление заявления учебной группы на кафедру «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета;
- утверждение темы заведующим кафедрой и назначение руководителя;
- получение индивидуального задания от руководителя, согласование плана-графика выполнения курсового проекта с руководителем;
- выполнение курсового проекта;
- представление готовой курсового проекта руководителю и размещение электронной версии работы на информационно-образовательном портале Финуниверситета;
- проверка курсового проекта руководителем;
- защита курсового проекта.

По каждому этапу в Финансовом университете устанавливаются крайние сроки выполнения;

Далее приводим краткое описание всех этапов выполнения курсового проекта.

2.1. Выбор и утверждение темы курсового проекта

Примерная тематика курсовых работ приводится в Приложении 1. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета тем или предложить свой вариант, обязательно согласовав ее с лектором по дисциплине «Управление ИТ-проектами» или преподавателем, ведущим практические занятия по данной дисциплине. Темы курсовых работ доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра и размещаются на сайте кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета.

Заявление учебной группы о закреплении тем передается на кафедру «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета старостой группы не позднее, чем через 3 недели после начала учебного года. Форма заявления представлена в Приложении 2.

2. Выбранные темы должны быть уникальны в рамках группы (выбор одинаковых тем несколькими студентами одной группы не допускается).

Распределение тем курсовых работ утверждаются руководителем Департамента бизнес-информатики. Для руководства курсовой работой каждому студенту назначается руководитель.

Изменение/уточнение темы возможно на основании личного заявления студента не позднее, чем за месяц до установленного срока защиты. В заявлении должна быть указана причина смены темы, новая формулировка темы должна быть согласована с руководителем курсового проекта.

Если студент не выбрал тему курсового проекта в установленный срок, Департамент назначает ему тему, при этом студент лишается права на изменение или уточнение темы.

2.2. Согласование плана курсового проекта с руководителем

В соответствии с действующим в Финуниверситете регламентом подготовки курсового проекта студент должен согласовать план курсового проекта с научным руководителем в течении 10 календарных дней после утверждения темы.

Руководитель курсового проекта задает каждому студенту **персональный набор ограничений для проекта**. Заданные ограничения фиксируются руководителем на специально созданном сетевом ресурсе, ссылку на который он получает от лектора по дисциплине «Управление ИТ-проектами».

Курсовой проект, выполненный без учета персональных проектных ограничений, к защите не допускается.

Руководитель совместно со студентом формируют план-график выполнения работы. План-график должен предусматривать несколько

контрольных точек по этапам выполнения работы и составляется таким образом, чтобы запланировать защиту не позднее, чем за неделю до окончания семестра.

Для данной курсового проекта принципиально важно, чтобы на первом этапе с руководителем был согласован бизнес-кейс проекта по выбранной теме. При планировании следует учитывать, что обычно выполнение этой части работы требует нескольких итераций. В качестве варианта план-графика можно предложить график с четырьмя контрольными точками:

1. Согласование бизнес-кейса проекта.
2. Согласование основных положений устава проекта и оргструктуры (не позднее чем через 2 недели после согласования бизнес-кейса с руководителем).
3. Согласование содержания проекта.
4. Согласование математической модели проекта (не позднее, чем за 1 неделю до сдачи работы).

2.3. Выполнение курсового проекта

Студент самостоятельно выполняет курсовой проект, отчитываясь перед руководителем о выполнении основных промежуточных этапов и получая необходимые консультации от руководителя.

Соблюдение графика выполнения контролируется руководителем. Регулярность предоставления отчетов о статусе выполнения работы отслеживается руководителем курсового проекта и влияет на итоговую оценку (см. критерии оценивания в разделе 4).

Подробные методические рекомендации по выполнению отдельных этапов работы содержатся в разделе 3.

2.4. Представление курсового проекта руководителю

Электронная версия курсового проекта, включающая файл отчета в формате DOCX или DOC, а также модель проекта (в виде архива), размещаются студентом на информационно-образовательном портале (ИОП) за две недели до назначенной даты защиты. Отчет о результатах проверки

текста работы в системе «Антиплагиат» автоматически формируется на ИОП. В случае выявления неправомерных заимствований сверх установленного в Финансовом университете максимального значения (15%), студент не допускается к защите курсового проекта, а работа возвращается на доработку.

Руководитель проверяет курсовой проект на соответствие предъявляемым к ней требованиям, пишет отзыв по форме, представленной в Приложении 12, размещает отзыв на ИОП и ставит отметку о допуске или не допуске работы к защите.

Работы, не допущенные до защиты, должны быть доработаны в соответствии с указанными замечаниями. Исправленная версия повторно размещается на ИОП. За попытку представления на проверку неудовлетворительной работы итоговая оценка снижается (см. Приложение 4).

Студент обязан представить бумажный вариант курсового проекта в Департамент бизнес-информатики, где она проходит регистрацию.

2.5. Защита курсового проекта

Защита является завершающим этапом выполнения студентом курсового проекта. Студент обязан явиться на защиту курсового проекта в назначенное руководителем время. К защите допускается студент, чья курсовая работа имеет положительный отзыв и допуск научного руководителя.

Защита курсового проекта осуществляется в компьютерном классе перед научным руководителем, как правило, в присутствии других студентов. До начала защиты студент должен разместить электронную версию всех материалов курсового проекта — в личной сетевой папке.

До начала защиты студент предоставляет преподавателю следующие документы:

— готовую курсовой проект, имеющую на заключительном листе личную подпись студента с пометкой о дате сдачи работы на кафедру;

- отзыв научного руководителя с его подписью и датой допуска курсового проекта к защите (выгрузить с ИОП и распечатать);
- справку о проверке курсового проекта в системе «Антиплагиат» (выгрузить с ИОП и распечатать).

Руководитель задает студенту вопросы, касающиеся содержательной части работы, просит решить отдельные ситуационные задания, применительно к рассматриваемому проекту, также проверяет навыки работы с математической моделью проекта в MS Project. В заключение студенту предоставляется слово для ответа на замечания научного руководителя, отмеченные в отзыве.

Оценка за курсовой проект выставляется по итогам ее защиты. На титульном листе курсового проекта научный руководитель проставляет дату защиты и оценку по балльно-рейтинговой и пятибалльной системам. Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») проставляется в экзаменационную ведомость. Студент, не защитивший курсовой проект в установленный срок, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Практикум по ИТ-менеджменту» и должен подготовить и защитить курсовой проект в период ликвидации академической задолженности.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В данном разделе представлены основные требования к структуре, содержанию и оформлению курсового проекта.

3.1. Требования к структуре и содержанию проекта

Курсовой проект включает в себя:

- титульный лист (Приложение 3);
- содержание;
- пояснительную записку;
- сопроводительные материалы.

Пояснительная записка содержит:

- введение с обоснованием актуальности темы, формулировкой целей и задач проекта;
- обоснование выбора алгоритма для решения поставленной задачи из известных алгоритмов или создание оригинального (собственного) алгоритма;
- описание алгоритма для решения поставленной задачи;
- описательную часть, в которой содержатся 10 разделов;
- руководство для пользователя (при необходимости);
- заключение, включая выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
- список литературы (используемых источников) на бумажных носителях либо электронном виде и интернет-ресурсов;
- приложения.

Общий объем курсового проекта без приложений должен составлять не менее 25 страниц.

Во введении обосновывается актуальность работы, кратко описывается объект и предмет исследования, формулируется цель работы.

В заключении приводятся краткие выводы по работе, перечисляются полученные результаты.

Основная часть работы состоит из следующих разделов:

1. Обоснование проекта.
2. Анализ окружения проекта.
3. Основные положения устава проекта.
4. Содержание проекта.
5. Организационная структура проекта.
6. Смета проекта.
7. Календарный план проекта.
8. План управления рисками проекта.
9. План управления изменениями.
10. Мониторинг выполнения проекта и управленческая отчетность.

3.2. Раздел «Обоснование проекта»

Данный раздел содержит бизнес-кейс проекта, предназначенный для последующего обоснования необходимости внедрения\разработки программного продукта, заявленного в теме курсового проекта.

Бизнес-кейс проекта представляет собой достаточно подробное описание ситуации as-is для выбранного объекта исследования (реального или вымышленного предприятия). Описание должно содержать краткую характеристику предприятия, достаточную для понимания масштабов предприятия, характера его деятельности, стратегии развития). В тексте этого раздела должны быть подробно описаны бизнес-причины, побуждающие предприятие инициировать проект внедрения/разработки/модификации ИС. В этой части работы необходимо сформулировать бизнес-цель проекта, а также описать потенциальные бизнес-выгоды, которые могут быть получены в случае успешной реализации проекта и последующей эксплуатации решения.

Для системного представления потенциальных бизнес-выгод необходимо заполнить матрицу структурированных бизнес-выгод. Идентификация бизнес-выгод в матрице должна быть проведена в соответствии с характером воздействия ИТ на бизнес с разной степенью определенности на качественном, измеримом, количественном и финансовом уровнях (см. Приложение 4).

Объем бизнес-кейса не должен превышать 2-4 стр. В тексте бизнес-кейса должны быть представлены данные, которые можно использовать для оцифровки измеримых, количественных и финансовых выгод. Все данные, использованные для написания бизнес-кейса должны быть получены из 12 имеющихся в открытом доступе источников (статьи, обзоры, истории успеха, интервью и пр.) Все ссылки на источники должны быть приведены в тексте работы.

В тексте раздела обязательно указать, кто будет являться исполнителем по проекту.

3.3. Раздел «Анализ окружения»

Проводя анализ окружения проекта, необходимо:

1. Идентифицировать заинтересованные стороны проекта и сформировать реестр заинтересованных сторон проекта (см. Приложение 5)
2. Проанализировать воздействие участников на проект, отразить результат анализа в виде карты заинтересованных сторон. Для визуализации результатов использовать матрицу Джонсона «Власть - интерес» и матрицу «Поддержка - Сила влияния» (см. Приложение 5).

Раздел должен содержать выводы по анализу реестра заинтересованных сторон.

3.4. Раздел «Основные положения устава проекта»

Основные положения устава проекта должны включать:

1. Название проекта;
2. Цель(и) проекта и решаемые задачи;
3. Результат(ы) проекта;
4. Ограничения проекта;
5. Допущения проекта;
6. Расписание основных контрольных событий проекта;
7. Бюджет проекта;
8. Критерии приемки результатов;
9. Обоснование полезности проекта.

Базовые рекомендации по формулировке основных положений устава проекта приводятся в Приложении 6. Все формулировки должны быть максимально конкретны и лаконичны.

3.5. Раздел «Содержание проекта»

Для описания содержания проекта, прежде всего, должен быть обоснован выбор модели ЖЦ проекта. Следует обратить внимание, на то что, если в названии темы курсового проекта отсутствует ссылка на конкретную методологию внедрения\разработки, подходящая последовательность этапов/стадий жизненного цикла проекта должна быть предложена студентом самостоятельно. Студентом может быть использована одна из типовых моделей ЖЦ ИС или предложена адаптивная модель, устанавливающая оптимальный для данного проекта баланс между моделями предиктивного, инкрементального и итеративного жизненных циклов. Разработка адаптивной модели ЖЦ приветствуется (оценивается выше, см. критерии оценивания в разделе 4). Выбор любой модели ЖЦ должен быть **обоснован**, исходя из описания проекта. Обоснованием не является перечисление преимуществ той-или иной модели ЖЦ, обоснование должно отвечать на вопрос, почему в данном случае оптимальной является та или иная модель.

При разработке модели ЖЦ проекта следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Стадии ЖЦ должны соответствовать принятым стандартам (международным, государственным, отраслевым) или лучшим практикам для проектов с подобными характеристиками.

2. Каждая стадия должна завершаться получением одного из результатов проекта, определенных в системе целей и результатов проекта.

3. Разбиение на стадии должно обеспечить потребности в планировании и контроле работ по проекту для всех организаций, вовлеченных в проект.

Модель ЖЦ проекта должна быть представлена в виде схемы/диаграммы и пояснительного текста.

Основным результатом описания содержания проекта является построение иерархической структуры работ проекта (ИСР) и формирование словаря ИСР. ИСР строится методом декомпозиции. Причем в основу декомпозиции первого уровня могут быть положены разные принципы: декомпозиция по этапам ЖЦ или декомпозиция по продуктам проекта и далее по компонентам ПО, которыми могут быть как прикладные, так и инфраструктурные подсистемы.

ИСР проекта с двумя уровнями декомпозиции необходимо представить в виде диаграммы (см. Приложение 7). Словарь ИСР проекта следует представить в виде таблицы (см. Приложение 7). Содержание работ в словаре ИСР должно быть описано достаточно подробно и *отражать специфику данного проекта*.

3.6. Раздел «Организационная структура проекта»

В разделе необходимо представить:

1. Штатное расписание проекта, отражающее потребность в ресурсах (см. Приложение 8);
2. Организационную диаграмму проекта;
3. Матрицу ответственности (RACI).

3.7. Раздел «Смета проекта»

В разделе «Смета проекта» представить разработанную с учетом штатного расписания и содержания проекта смету. Смета проекта классифицирует затраты по категориям. Примерный шаблон для составления сметы проекта приводится в Приложении 9.

3.8. Раздел «Календарный план проекта»

Для построения и оптимизации календарного плана проекта использовать MS Project. Требования к настройкам математической модели проекта представлены в Приложении 10.

В отчете по курсовой работе необходимо отразить длину критического пути и затраты до и после выравнивания ресурсов.

3.9. Раздел «План управления рисками»

Для построения плана управления рисками необходимо (см. Приложение 11):

1. Разработать шкалу оценки вероятности рисков.
2. Разработать шкалу оценки последствий (угроз).
3. Построить матрицу для оценки величины риска.
4. Определить категории рисков.
5. Провести идентификацию и качественный анализ рисков проекта. Для

этого:

- определить не менее 5 рисков, способных повлиять на проект, и задокументировать их характеристики;
- провести оценку величины риска с использованием матрицы оценки риска. Результаты представить в виде реестра рисков. Рекомендуемая структура реестра рисков приводится в Приложении 11.

6. Ранжировать риски по величине и сгруппировать по категориям.

7. Разработать план мероприятий по реализации стратегии реагирования на риски.

8. Выполнить необходимые настройки для отображения реестра рисков в модели MS Project. Провести качественный анализ рисков в MS Project.

3.10. Раздел «План управления изменениями»

План управления изменениями должен включать модель процесса управления изменениями, выполненную в любой подходящей для этого нотации описания бизнес-процессов, и комментарии к модели.

Процесс должен отражать порядок регистрации, анализа и реализации изменений, включая порядок эскалации проблем на уровень спонсора\куратора проекта. Предложенный процесс должен соответствовать масштабу проекта и его оргструктуре.

3.11. Раздел «Мониторинг выполнения проекта и управленческая отчетность»

В разделе необходимо:

— отразить требования к набору показателей, которые предлагается использовать для оценки фактической продуктивности проекта,

— отразить требования к комплекту отчетов о ходе выполнения проекта, предназначенных для спонсора/куратора проекта/менеджера проекта.

Требования к показателям следует представить в виде таблицы, содержащей название показателя, формулу расчета, возможный интервал значений, пороговые значения, влияющие на принятие управленческих решений, примечания. В примечаниях следует описать ограничения на расчет показателей, например, возможно использование показателей, рассчитываемых по задачам всех уровней ИСР, только по суммарным задачам, только по листовым задачам ИСР. Пример оформления требований к показателям представлены в Приложении 12.

Необходимо описать требования для трех различных собственных расчетных показателей, отражающих различные аспекты хода выполнения проекта (затраты, трудозатраты, сроки и пр.). Помимо этого, в таблицу можно включить показатели освоенного объема (с детальным описанием расчетных формул). В модели проекта должны быть настроены формулы для расчета соответствующих показателей. Особое внимание следует уделить правильности расчета агрегированных значений показателей и обработке возможных исключений.

Для любых трех показателей из таблицы с требованиями необходимо использовать графические индикаторы (семафоры). Требования к настройке семафоров также должны быть представлены в виде таблицы, описывающей интервалы срабатывания индикаторов. Таблица должна иметь следующую структуру: название показателя, интервал значений, описание интервала, пример графического индикатора. Пример таблицы с требованиями к настройке индикаторов также приводится в Приложении 12. Соответствующие семафоры должны быть настроены в модели проекта.

В этом же разделе работы необходимо описать требования к структуре и содержанию отчетов о ходе выполнения проекта, предназначенных для

представления руководству, а также для использования менеджером проекта. Требования к отчетам также необходимо представить в виде таблицы. Структура таблицы: название отчета, описание отчета, целевая аудитория, частота представления отчета. Пример таблицы с требованиями к отчетам также приводится в Приложении 12. В модели проекта соответствующие отчеты должны быть настроены. Отчеты в модели должны быть авторскими (или построены на основе готовых отчетов, или созданы полностью самостоятельно).

3.12. Требования к оформлению

Курсовой проект должен быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка».

Титульный лист курсового проекта оформляется в соответствии с Приложением 3.

Бумажный вариант курсового проекта предоставляется на кафедру в сброшюрованном виде. Работа распечатывается на одной стороне листа бумаги формата А4 через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14, в таблицах — 12, в подстрочных сносках — 10.

Электронная версия отчета должна быть представлена в едином файле формата DOCX или DOC. Файл должен содержать автоматически вставленное оглавление, автоматически нумеруемые сноски, рисунки и таблицы, перекрестные ссылки на упоминаемые в тексте рисунки и таблицы. При форматировании текста приветствуется использование стилей.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

Оценка курсового проекта осуществляется по нескольким критериям. Максимальная оценка 100 баллов складывается из следующих слагаемых:

- Оценка содержания отчета по курсовой работе (максимум 45 баллов);
- Оценка полноты и корректности математической модели проекта (максимум 25 баллов);
- Оценка защиты курсового проекта (максимум 30 баллов).

В приложении 13 приводятся перечень формальных критериев для оценки работы.

Снижение оценки производится за:

Несоблюдение календарного графика подготовки работы, не представление руководителю промежуточных отчетов о статусе подготовки курсового проекта. Вычитается до 20 баллов.

Несоблюдение требований к оформлению в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ Р 7.0.5—2008. Вычитается от 1 до 6 баллов.

Не использование возможностей MS Word по профессиональному оформлению текстов (стили, автоматическое оглавление, автоматическая нумерация рисунков и таблиц). Вычитается от 1 до 4 баллов.

К защите не допускаются неполные работы (работы без модели проекта в MS Project, а также работы, в которых отсутствует один из 10 разделов работы).

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.
2. ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
3. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
5. ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
7. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.
8. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
9. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
10. Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами: учебное пособие для академического бакалавриата. М: Издательство Юрайт, 2018 .— 228с .
3. Грекул [В.И.](#), Коровкина [Н.Л.](#), Куприянов [Ю.В.](#) Проектное управление в сфере информационных технологий - М.:Бином. Лаборатория знаний , 2013.- 336 с.
4. Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами [электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Светлов.— 2, перераб. и доп.— М.: "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 232 с. — ЭБС: Znanium

5. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта РМІ РМВОК®. Изложение методологии и опыт применения. : учебное пособие / Павлов А.Н. 5-е издание — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 271 с.- режим доступа <https://book.ru/book/923247>

6. Поляков Н.А., Мотовилов О.В., Лукашов Н.В. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата.— М: Издательство Юрайт, 2018 .— 330 с.

7. Морозова О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов [электронный ресурс]: учебное пособие — М. : Кнорус, 2019. — 268 с. - режим доступа <https://www.book.ru/book/932061>

8. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2013 в управлении проектами: Самоучитель. СПб.: БХВ-Петербург, 2014 .— 461 с.:

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

9. <http://www.microsoftproject.ru> - Портал MicrosoftProject.ru

1. <http://www.pmexpert.ru> - Сайт компании РМ Эксперт

10. <http://www.pmpofy.ru/> - Портал «Профессионал управления проектами»

11. <http://www.pmi.ru> - Московское отделение Project Management Institute

12. <http://pmpractice.ru/training/testing/> - Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА»

13. Истории успеха клиентов Oracle.

<http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/ebs-r12-1-booklet-sept-2011-1355209.pdf>

14. Кейсы по внедрению решений SAP:

[http://www.e-executive.ru/knowledge/announcement/1706064/?page=0,](http://www.e-executive.ru/knowledge/announcement/1706064/?page=0)

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

15. Кейс внедрения корпоративного портала
<http://www.qoda.ru/about/case-bank-metkombank.php>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерные темы курсового проекта

1. Управление проектом внедрения системы электронного документооборота в организации среднего бизнеса.
2. Управление проектом миграции корпоративной ИТ-инфраструктуры в облачную среду предприятия.
3. Управление проектом модернизации сетевой инфраструктуры промышленного предприятия.
4. Управление проектом внедрения корпоративной CRM-системы в сервисной компании.
5. Управление проектом создания резервного центра обработки данных организации.
6. Управление проектом внедрения системы управления ИТ-услугами на основе библиотеки ITIL в ИТ-подразделении.
7. Управление проектом автоматизации процессов бюджетирования в холдинговой структуре.
8. Управление проектом внедрения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия.
9. Управление проектом интеграции ERP-системы с внешними информационными сервисами.
10. Управление проектом построения корпоративного портала для внутреннего взаимодействия сотрудников.
11. Управление проектом внедрения системы управления информационной безопасностью в организации.
12. Управление проектом автоматизации складской логистики с использованием штрихкодирования.
13. Управление проектом внедрения BI-платформы для аналитической поддержки управленческих решений.
14. Управление проектом перехода на сервисную модель предоставления ИТ-услуг в компании.

15. Управление проектом внедрения системы электронного архива в государственном учреждении.
16. Управление проектом цифровой трансформации бизнес-процессов торгового предприятия.
17. Управление проектом внедрения системы управления знаниями в ИТ-компании.
18. Управление проектом модернизации рабочих станций сотрудников организации.
19. Управление проектом внедрения системы управления доступом и учетными записями пользователей.
20. Управление проектом автоматизации кадрового учета в корпоративной информационной системе.
21. Управление проектом внедрения системы управления инцидентами ИТ-подразделения.
22. Управление проектом создания корпоративной системы видеоконференцсвязи.
23. Управление проектом оптимизации ИТ-портфеля предприятия.
24. Управление проектом внедрения системы управления мобильными устройствами сотрудников.
25. Управление проектом перехода на микросервисную архитектуру корпоративной информационной системы.
26. Управление проектом внедрения системы резервного копирования и восстановления данных.
27. Управление проектом автоматизации процессов закупки ИТ-оборудования.
28. Управление проектом внедрения системы электронных торгов в организации.
29. Управление проектом построения отказоустойчивой сетевой архитектуры предприятия.
30. Управление проектом внедрения платформы дистанционного обучения сотрудников.

31. Управление проектом оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру предприятия.
32. Управление проектом внедрения системы управления изменениями в ИТ-подразделении.
33. Управление проектом создания центра компетенций по цифровым технологиям в организации.
34. Управление проектом внедрения системы автоматизированного тестирования программного обеспечения.
35. Управление проектом модернизации системы хранения данных предприятия.
36. Управление проектом внедрения чат-бота для автоматизации взаимодействия с клиентами.
37. Управление проектом автоматизации процессов сервисного обслуживания оборудования.
38. Управление проектом перехода на электронные трудовые книжки и кадровой документации.
39. Управление проектом внедрения системы управления корпоративными лицензиями программного обеспечения.
40. Управление проектом построения аналитической платформы обработки больших данных.
41. Управление проектом внедрения системы управления качеством ИТ-услуг.
42. Управление проектом цифровизации процессов внутреннего аудита организации.
43. Управление проектом внедрения системы управления рисками ИТ-проектов.
44. Управление проектом интеграции мобильного приложения с корпоративной информационной системой.
45. Управление проектом внедрения системы управления производственными ресурсами предприятия.

46. Управление проектом автоматизации документооборота в строительной компании.
47. Управление проектом перехода на модель DevOps в ИТ-подразделении организации.
48. Управление проектом внедрения системы управления договорами в корпоративной среде.
49. Управление проектом модернизации системы информационной безопасности в финансовой организации.
50. Управление проектом внедрения системы анализа клиентских данных в торговой сети.
51. Управление проектом внедрения платформы электронных закупок в холдинге.
52. Управление проектом автоматизации процесса стратегического планирования предприятия.
53. Управление проектом внедрения системы контроля и учета рабочего времени сотрудников.
54. Управление проектом построения корпоративной облачной инфраструктуры частного типа.
55. Управление проектом внедрения системы управления портфелем ИТ-проектов.
56. Управление проектом автоматизации процессов внутренней отчетности организации.
57. Управление проектом внедрения системы цифрового взаимодействия с поставщиками.
58. Управление проектом модернизации телекоммуникационной инфраструктуры предприятия.
59. Управление проектом внедрения системы автоматизированного управления ИТ-активами.
60. Управление проектом цифровой трансформации ИТ-службы предприятия среднего бизнеса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заведующему кафедрой
«Учет и информационные
технологии в бизнесе»
Морозовой Н.С.
от студента (-ки) _____ курса,
учебной группы № _____

Направление

Профиль

(Фамилия, инициалы)

Контактные данные:

Тел.

мобильный _____

e-

mail _____

—

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной тему курсового проекта (курсового проекта)

« _____ » _____ 20__ г

_____ (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Титульный лист

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Липецкий филиал

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе»

Направление _____

Профиль _____

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: _____

ТЕМА

(название темы прописными буквами 16 шрифтом)

Преподаватель: _____

Студент _____

Личное дело № _____

Курс _____

Липецк 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Идентификация бизнес-выгод ИТ-проекта

		ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС		
		Создание новых возможностей	Повышение эффективности операций	Отказ от операций
СТЕПЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ	Финансовые			
	Количественные			
	Измеримые			
	Качественные			

Характер воздействия на бизнес:

1. *Создание новых возможностей:* функциональность информационной системы, ранее не доступная компании, ее контрагентам или иным заинтересованным сторонам.

2. *Повышение эффективности операций:* функциональность новой информационной системы позволяет выполнять существовавшие до нее операции гораздо более эффективно.

3. *Отказ от операций:* информационная система позволяет отказаться от выполнения отдельных операций, в связи с изменением бизнес-процессов.

Степень определенности:

1. *Качественные* - выгоды от использования ИС, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения или суждения.

2. *Измеримые* - выгоды данного типа поддаются измерению до внедрения, при этом невозможно оценить значение соответствующего показателя после внедрения.

3. *Количественные:* - выгоды характеризуются наличием показателей, позволяющих измерить их значение до выполнения проекта и оценить с высокой степенью точности значение показателя после реализации проекта.

4. *Финансовые* - это бизнес-выгоды, которые могут быть выражены в терминах финансовых показателей. Очевидно, финансовые выгоды есть

результат «обогащения» количественных бизнес-выгод финансовыми данными. Агрегированные финансовые выгоды проекта образуют базу для построения финансовой модели проекта (ROI-модель) и расчета инвестиционных показателей: NPV, IRR, периода окупаемости.

В матрице указываются бизнес-выгоды, определяющие стратегическую важность и значимость проекта,

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анализ окружения проекта


Рекомендуемая структура реестра заинтересованных сторон

Группа	ФИО	Должность	Роль в проекте	Влияние на проект	Полномочия	Интерес к проекту

Модель Джонсона «Власть-интерес»



Матрица «Поддержка - Сила влияния»

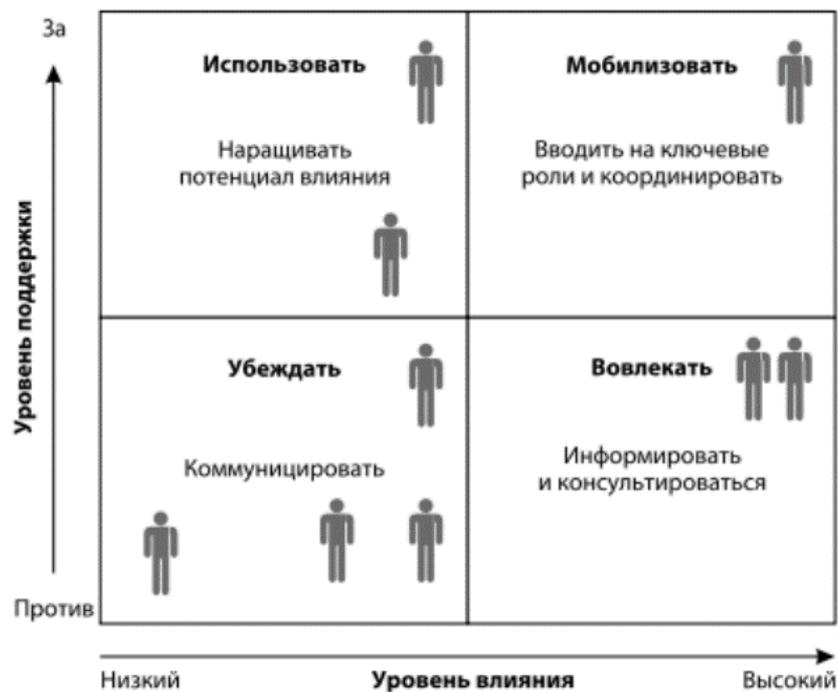

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основные положения устава проекта

<p>Цели проекта отвечают на вопрос «зачем?» и описывают бизнес-потребности, которые решаются в результате исполнения проекта. Бизнес-цель ИТ-проекта (должна носить тактический или стратегический характер, точно и ясно сформулирована).</p>	<p>Целями проекта могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменения в Компании (автоматизация бизнес-процессов для повышения эффективности основной производственной деятельности). • Реализация стратегических планов (завоевание доли растущего рынка за счет вывода на него нового продукта). • Выполнение контрактов (разработка заказного ПО). • Разрешение специфических проблем (доработка программного продукта в целях приведения его в соответствие с изменениями в законодательстве).
<p>Результаты проекта отвечают на вопрос, что должно быть получено после его завершения.</p>	<p>Результаты проекта должны определять:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Какие именно бизнес-выгоды получит заказчик в результате проекта. • Какой продукт или услуга. Что конкретно будет произведено по окончании проекта. • Высокоуровневые требования. Краткое описание и при необходимости ключевые свойства и/или характеристики продукта/услуги. • Результаты проекта должны быть измеримыми (при оценке результатов проекта должна иметься возможность сделать заключение достигнуты оговоренные в концепции результаты или нет).
<p>Допущения связаны с управлением рисками проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • инфляция не превысит ... %, • стоимость лицензий на ПО сторонних разработчиков не изменится, • Заказчик предоставит информацию, которую не удалось от него получить в рамках предпроектного обследования.
<p>Ограничения сокращают возможности проектной команды в выборе решений, а также показывают, что принципиально не включено в проект.</p> <p>Необходимо сформулировать те требования к системе, которые могут ожидать заказчика по умолчанию, но не включаются в рамки данного проекта.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Специфические нормативные требования. Например, обязательная сертификация продукта, услуги на соответствие определенным стандартам. • Специфические технические требования. Например, разработка под заданную программно-аппаратную платформу. • Специфические требования к защите информации. • В рамках проекта не предполагается выполнение работ по... • В расчет трудозатрат проекта не включены работы по ...
<p>Расписание основных контрольных событий</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Время начала и окончания проекта • Ключевые вехи проекта (3-5 шт.)
<p>Бюджет проекта</p>	<p>Сумма, выделенная организацией заказчиком на реализацию проекта</p>

<p>Критерии приемки должны определять числовые значения характеристик системы, которые должны быть продемонстрированы по результатам приемосдаточных испытаний или опытной эксплуатации и однозначно свидетельствовать о достижении целей проекта.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Время формирования комплекта отчетов не превышает ... • Среднее время оформления электронной заявки составляет... • Производительность системы в режиме опытно промышленной эксплуатации составляет ...
<p>Обоснование полезности проекта должен содержать краткое технико-экономическое обоснование проекта:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для кого предназначены результаты проекта. • Описание текущей ситуации «As Is». Какие у потенциального заказчика существуют проблемы. • Каким образом результаты проекта решают эти проблемы («To Be»). • Насколько значимо для клиента решение данных проблем (оценка экономического эффекта). • Какие преимущества в итоге из этого может извлечь компания-исполнитель проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Диаграмма ИСР проекта



Рекомендуемая структура словаря ИСР

№	Этап	Состав работ	Трудоемкость (чел/ час)	Результат

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Штатное расписание проекта

№	Должность	Структурное подразделение	Количество штатных единиц	Тарифная ставка, руб/час

В штатном расписании указываются ставки, до вычета налогов.

Условные обозначения матрицы ответственности (RACI)

Обозначение	Расшифровка	Описание
Исп. (R)	Исполнитель (Responsible)	Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К каждой задаче должно быть приписано не менее одного исполнителя
Утв. (A)	Утверждающий (Accountable)	Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный
Согл. (C)	Согласующий (Consulted)	Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер
Н. (I)	Наблюдатель (Informed)	Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер

Структура матрицы RACI

1. По вертикали в матрице отражаются основные работы проекта (не ниже уровня 2-3 ИСР)
2. По горизонтали в матрице перечисляются группы/ роли внутри проектной команды.
3. С помощью кодов в ячейках на пересечении соответствующих столбцов с ролями и строк с работами проекта указывается степень участия, формальные полномочия и распределение ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Шаблон сметы проекта

Стоимость работ:			
<i>Категория специалиста</i>	<i>Трудозатраты, час</i>	<i>Ставки, руб/час</i>	<i>Итого</i>
Спонсор проекта		0	0
РП от исполнителя			
РП от заказчика		0	0
Архитектор			
Стоимость оборудования:			
<i>Категория расходов</i>	<i>Количество</i>	<i>Стоимость за единицу, руб</i>	<i>Итого</i>
Стоимость лицензий:			
<i>Категория расходов</i>	<i>Количество</i>	<i>Стоимость за единицу, руб</i>	<i>Итого</i>
Командировочные расходы:			
Инфраструктурные расходы:			
<i>Категория расходов</i>	<i>Количество</i>	<i>Стоимость за единицу, руб</i>	<i>Итого</i>
Телефонная связь			
Интернет			
ИТОГО			

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Требования к порядку построения математической модели проекта в MS Project

1. Настроить общие параметры MS Project:
 - 1.1. Установить валюту проекта.
 - 1.2. Установить время начала и окончания работ.
 - 1.3. Настроить параметры автосохранения.
 - 1.4. Внести необходимые исключения в базовый стандартный календарь.
2. Заполнить лист ресурсов проекта (в соответствии со сметой проекта).
3. Сформировать ИСР проекта в соответствии с разработанным словарем ИСР.
4. Сформировать сетевой график проекта. Установить связи между задачами. Обязательно предусмотреть вехи. Убедиться в том, что сетевой график проекта сформирован корректно. Отобразить критический путь проекта.
5. Выполнить назначение ресурсов на задачи.
6. Провести планирование сметы проекта в разрезе заданных статей затрат с разбивкой по временным периодам. Тип периода (месяц, квартал, полугодие и пр.) выбрать, исходя из длительности проекта.
7. Выполнить оптимизацию плана проекта:
 - 7.1. Провести анализ проекта. Проанализировать задачи проекта, лежащие на критическом пути. Выявить задачи, имеющие временной резерв.
 - 7.2. Провести выравнивание ресурсов. Использовать разные режимы выравнивания (автоматическое, в том числе выравнивание по нескольким задачам, выравнивание по отдельным ресурсам, ручное, выравнивание с помощью визуального оптимизатора ресурсов на основании загруженности ресурсов, на основании приоритетности задач проекта).

7.3. Провести анализ ресурсного критического пути, т.е. определить те ресурсы, которые заняты на задачах критического пути или необходимы для выполнения задач.

7.4. Обосновать оптимизацию проекта по срокам и ресурсным ограничениям.

7.4. Добиться соответствия плановых затрат смете проекта.

7.5. Сохранить базовый план проекта.

В отчете необходимо отразить состояние проекта до и после оптимизации.

8. Внести в модель данные о фактическом выполнении работ.

Представленный в приложении перечень действий в MS Project является минимально необходимым.



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Управление проектными рисками

Категории рисков (пример)

Шкала оценки вероятности рисков (пример)

Интервал вероятностей	Словесная формулировка	Числовая оценка
1%-33%	Низкая	1
34%-67%	Средняя	2
68%-99%	Высокая	3

Шкала оценки последствий (пример)

Перерасход средств	Отставание от расписания	Описание	Числовая оценка
До 5%	1 неделя	Небольшая потеря производительности	1
До 15%	2 недели	Умеренное снижение производительности	2
Более 30%	1 месяц	Серьезный ущерб для производительности	3

Матрица оценки рисков (пример)

Вероятность \ Угроза	Низкая (1)	Средняя (2)	Высокая (3)
Небольшая (1)	1	2	3
Умеренная (2)	2	4	6
Серьезная (3)	3	6	9

Реестр рисков

Идентификатор риска	Наименование	Описание	Вероятность возникновения	Категория	Последствия (угроза)	Ранг риска (величина риска)	Стратегия реагирования	Близость	Триггеры	Тенденция	Владелец риска

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Пример таблицы с описанием требований к расчетному показателю для проекта

№ п/п	Наименование показателя	Расчетная формула	Интервал значений	Пороговые значения	Примечания
1	Относительное отклонение стоимости, %	$(\text{ФС}-\text{БС})/\text{БС} * 100$, где ФС - фактическая стоимость, БС - базовая стоимость	От -100 до	110%-серьезные отклонения, 120% - критические отклонения	Показатель не рассчитывается для работ, выполнение которых не началось, и вех проекта
2					
3					

Пример таблицы с описанием требований к графическим индикаторам проекта

№ п/п	Наименование показателя	Интервал значений	Описание интервала	Вид семафора	Примечания
1	Относительное отклонение стоимости, %	<110 От 110 до 120 >120	Норма Серьезные отклонения Критические отклонения	Зеленый круг Желтый круг Красный круг	Индикатор предоставляется для задач всех уровней ИСР, кроме вех проекта и будущих задач
2					
3					

Пример таблицы с описанием требованиям к отчетам

Структура таблицы: название отчета, описание отчета, целевая аудитория, частота представления отчета

№ п/п	Наименование показателя	Описание отчета	Целевая аудитория	Частота предоставления	Примечания
1	Отчет о текущих трудозатратах	Отчет содержит диаграмму (гистограмму), отражающую распределение фактических и базовых	Куратор проекта	По окончании этапа	Отчет представляется в виде файла docx на e-mail куратора

		трудозатрат по задачам ИСР 2-го уровня иерархии.			
2					
3					

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Форма отзыва руководителя

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе»

ОТЗЫВ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ)

Студента _____ учебной группы _____

Тема _____

Руководитель: _____
(степень, звание, должность, фамилия, инициалы)

Наименование критерия	Показатель критерия, позволяющий его оценить в максимальный балл	Максим. балл	Факт. балл
1	2	3	4
1. Подготовительный этап выполнения курсового проекта (курсового проекта)		15	
Выбор темы, составление библиографии и плана в установленные сроки	План должен быть вовремя согласован, быть логичным и раскрывающим тему, цели и задачи проекта (работы). Курсовая работа должна состоять из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Курсовой проект должен включать пояснительную записку, аналитическую и расчетную часть	15	
2. Общая характеристика курсового проекта / курсового проекта		25	
Полнота раскрытия темы	Тема курсового проекта (курсового проекта) должна быть полностью раскрыта: подробно рассмотрены цель, все задачи и все аспекты данной темы	15	
Логичность составления плана, изложения основных вопросов	Все вопросы должны быть рассмотрены логично, в соответствии с определенной последовательностью и взаимосвязью	10	
3. Наличие элементов научного анализа		22	

Знание и отражение в работе последних изменений в законодательстве и на практике	Курсовой проект (курсовая работа) должна быть подготовлена с учетом последних изменений законодательства, нововведений практики по рассматриваемой теме	10	
Наличие дискуссионных вопросов	В курсовом проекте (курсовой работе) должно быть отражено знание автором различных точек зрения по рассматриваемой теме	6	
Наличие аргументированной точки зрения автора	В курсовом проекте (курсовой работе) должно присутствовать собственное мнение автора, оно аргументировано	6	
4. Оформление курсового проекта (курсового проекта) и соблюдение сроков		18	
Аккуратность оформления	Курсовая работа (проект) должна быть аккуратно оформлена (с соблюдением предъявляемых требований)	6	
Правильность оформления курсового проекта (проекта)	В курсовом проекте / курсовой работе должны быть правильно оформлены цитаты, список использованной литературы и т.д.	6	
Сроки представления	Курсовой проект (курсовая работа) должна быть представлена в установленные сроки	6	
Антиплагиат	Процентная доля оригинальности работы	ориг. - _____ % цит. - _____ %	
5. Замечания по курсовому проекту (курсовой работе) и предварительная оценка		80	
Замечания по тексту работы	См. замечания на стр.		
	Общие замечания руководителя		
Результаты оценки проделанной работы	86-100 баллов – «отлично» 70-85 баллов – «хорошо» 50-69 баллов – «удовлетворительно» менее 50 – «неудовлетворительно»		
Время и место защиты	« _____ » _____ 202__ в _____ ч. _____ мин. По адресу: _____		
6. Этап защиты курсового проекта (курсового проекта) и ответов на дополнительные вопросы		20	
Вопросы, которые необходимо подготовить к защите	Ответить на вопросы, указанные в общих замечаниях и по тексту курсового проекта (курсового проекта)		

Дополнительные вопросы, заданные при защите			
7. Оценка с учетом защиты	86-100 баллов – «отлично» 70-85 баллов – «хорошо» 51-69 баллов – «удовлетворительно» 50 баллов и менее – «неудовлетворительно»		
Дата и подпись научного руководителя	« _____ » _____ 202__		
